



# RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DA  
JUSTIÇA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS

PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO



# RESUMO DO CONTRATO

- ▶ Processo nº 6.231/2013
- ▶ Tomada de Preços nº 07/2013
- ▶ Contrato nº68/2013
- ▶ Ordem de início: 20 de Janeiro de 2014
- ▶ Valor do Contrato: R\$67.326,86
- ▶ Prazo: 30 dias –etapa única.
- ▶ Fiscal da reforma: Eng.º Marcelo Nakao.
- ▶ Construtora responsável: Eletroline - CREA/MS 2937
- ▶ Engenheiros Responsáveis:
  - ▶ Airton Lima Menezes – MS289/D – Engenheiro Civil
  - ▶ Wesley Marcos Santos– MS5688/D – Engenheiro Eletricista




# OCORRÊNCIAS NO PERÍODO

- ▶ Não foi autorizado pela fiscalização instalar o letreiro na fachada, uma vez que a sala de espera será compartilhada com a Prefeitura e poderá descaracterizar o prédio de utilização compartilhada, podendo passar a ideia de ser exclusivo da Justiça do Trabalho. Fica assim cancelado o item 3.29 da Planilha de Quantitativo “Letra de aço inox nº22 no valor R\$3.544,27”.
- ▶ Foi abonado 8 dias úteis de trabalho pela fiscalização, justificado pela impossibilidade de se realizar o serviço de pintura externa, assim o término dos serviços passaram para o dia 12 de março, (após o feriado de carnaval).
- ▶ Foi solicitado pelo Presidente do TRT, a possibilidade de incluir o piso tátil no escopo do contrato. Feito a proposta de aditivo pela Engenharia, estamos aguardando a autorização da Administração para dar a Ordem de Serviços.

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Detalhe da assinatura da Ordem de Serviço

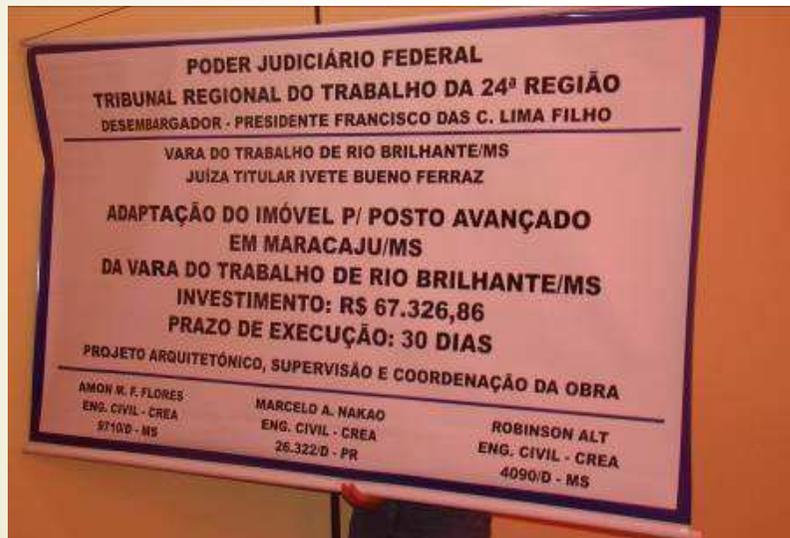



Detalhe do recolhimento de entulho



Detalhe das caixas de passagem de elétrica



Detalhe de abertura de Vão para recepção e secretaria



Detalhe de requadramento dos vãos de portas



Detalhe de vão para caixa de ar condicionado



Detalhe da infra estrutura elétrica e de telefonia



Detalhe da base do porta bandeiras



Detalhe do rack de parede



Detalhe das fechaduras de auto tráfego das novas portas



Detalhe do novo quadro de energia, com etiquetas orientadoras



Detalhe das tomadas de energia e lógica



Detalhe de fechamento de vão na sala de audiência



Detalhe de bancada e vidro da recepção e secretaria



Detalhe dos Mastros instalados



Detalhe de novas louças instaladas nos banheiros

Detalhe das instalações (luminárias e ar condicionados)



Sala de audiência pintada na cor verde "erva doce"

Detalhe do guarda corpo e corrimão





# CONCLUSÃO

- ▶ A reforma foi concluída atendendo as expectativas de qualidade, observando as especificações técnicas e entro do prazo estipulado, assim sendo recomendo o pagamento no valor de R\$ 63.782,59. conforme planilha em anexo.



---

- ▶ Marcelo Nakao
- ▶ Eng. Civil CREA 7881-D/MS

Campo Grande, 17 de março de 2014
