



RELATÓRIO DA MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA

REFORMA DO FORO DE DOURADOS

PERÍODO DE 27 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO



RESUMO DO CONTRATO

- ▶ Processo nº 5.465/2013
- ▶ Tomada de Preços nº 05/2013
- ▶ Contrato nº 67/2013
- ▶ Ordem de início: 20 de Janeiro de 2014
- ▶ Valor do Contrato: R\$469.540,61
- ▶ Prazo: 120 dias – 4 etapas de 30 dias
- ▶ Fiscal da reforma: Eng.º Marcelo Nakao.
- ▶ Construtora responsável: Eletroline - CREA/MS 2937
- ▶ Engenheiros Responsáveis:
 - ▶ Vanderli Raiter Maximo – MS3117/D – Tecnólogo em Telefonia
 - ▶ Airton Lima Menezes – MS289/D – Engenheiro Civil
 - ▶ Cleiton Freitas Franco – MS8099/D – Engenheiro Eletricista



OCORRÊNCIAS NO PERÍODO

- ▶ Não foi autorizado pela fiscalização, iniciar os serviços do pórtico da fachada, devido ao risco de interferência com o acesso da agência da CEF, estamos aguardando o projeto de implantação do posto bancário para corrigir possíveis incompatibilidades, evitando assim retrabalhos.
- ▶ Foi solicitado pela fiscalização o adiantamento dos serviços de esgoto, e rede de água fria nos banheiros do público, bem como o seus acabamentos, aproveitando a oportunidade do feriado do carnaval, período onde o Foro ficou fechado oferecendo 4,5 dias consecutivos, para liberar esses banheiros.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Detalhes do canteiro de obras



Detalhe da demolição do arquivo



Detalhe do alojamento dos funcionários da obra



Detalhe do alojamento dos funcionários da obra



Detalhe da valeta onde foi embutida as tubulações de incêndio e águas pluviais




Detalhe da estrutura da sala de espera do núcleo de conciliação e da fachada da secretaria do Foro



Evolução da reforma na área da copa e da secretaria do Foro



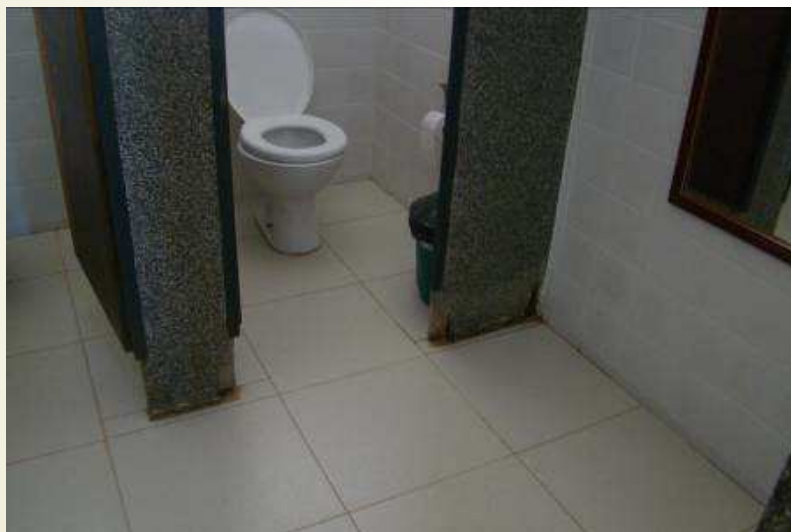

Detalhe dos banheiros do público pronto



Evolução na reforma na sala da OAB (futura salas de audiências)



Fechamento do antigo protocolo e fundação da caixa d'água





CONCLUSÃO

- ▶ A reforma foi concluída atendendo as expectativas de qualidade, observando as especificações técnicas e entro do prazo estipulado, assim sendo recomendo o pagamento no valor de R\$ 76.765,40 conforme planilha em anexo.



▶ Marcelo Nakao
▶ Eng. Civil CREA 7881-D/MS
