



RELATÓRIO DA MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA

REFORMA DO FORO DE DOURADOS

PERÍODO DE 29 DE MARÇO À 29 DE ABRIL



RESUMO DO CONTRATO

- ▶ Processo nº 5.465/2013
- ▶ Tomada de Preços nº 05/2013
- ▶ Contrato nº67/2013
- ▶ Ordem de início: 20 de Janeiro de 2014
- ▶ Valor do Contrato: R\$469.540,61
- ▶ Prazo: 120 dias – 4 etapas de 30 dias
- ▶ Fiscal da reforma: Eng.º Marcelo Nakao.
- ▶ Construtora responsável: Eletroline - CREA/MS 2937
- ▶ Engenheiros Responsáveis:
 - ▶ Vanderli Raiter Maximo – MS3117/D – Tecnólogo em Telefonia
 - ▶ Airton Lima Menezes – MS289/D – Engenheiro Civil
 - ▶ Cleiton Freitas Franco – MS8099/D – Engenheiro Eletricista




OCORRÊNCIAS NO PERÍODO

- ▶ Não foi autorizado ainda os serviços de impermeabilização da cobertura, devido a falta de definição da CEF e da execução dos projetos executivos da infraestrutura da Segurança Institucional.
- ▶ Foi solicit
- ▶ Foram propostos algumas melhorias no projeto pelos usuários, e a Fiscalização aguarda a manifestação sobre os pleitos.
- ▶ A Caixa Econômica Federal não apresentou ainda o projeto de mudança para avaliação da Fiscalização, bem como o seu Plano de Trabalho e Cronograma Físico. A obra corre o risco de sofrer atrasos, pois não há possibilidade de prosseguir a reforma com CEF ocupando o espaço que esta dentro do nosso escopo de trabalho.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Detalhe da parede de gesso Acartonado Acústica

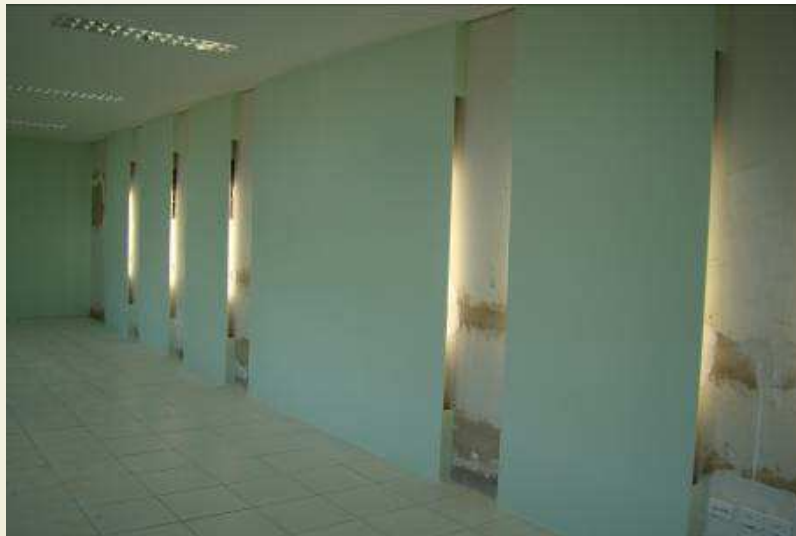

Detalhe da impermeabilização do corredor externo





Detalhe da porta de madeira compensada lisa para
cera ou verniz e conjunto de ferragens



Detalhe da porta de vidro temperado colorido
verde, espessura 10mm e jogo de ferragens



Detalhe do portão de elevação para veículos em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado



Detalhe do motor para portão de elevação



Detalhe do requadro para vãos de esquadrias



Detalhe da estrutura metálica em treliça



Detalhe da telha trapezoidal



Detalhe do rufo e calha em chapa de aço galvanizado



Detalhe da parede chapiscada e emboçada



Detalhe dos azulejo 15x15



Detalhe da pintura látex acrílica interna sem selador e teto com pintura PVA



Detalhe do contrapiso



Detalhe do piso cerâmico padrão médio



Detalhe do vaso sanitário com caixa de descarga acoplada





CONCLUSÃO

- ▶ A etapa foi concluída atendendo as expectativas de qualidade, observando as especificações técnicas e entro do prazo estipulado, assim sendo recomendo o pagamento no valor de R\$ 169.641,61 conforme planilha em anexo, descontado o valor de R\$ 244,26 , referente o valor pago à mais na 1ª medição, totalizando o valor de R\$169.397,35



▶ Marcelo Nakao

▶ Eng. Civil CREA 7881-D/MS
