

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU/MS
(PROCESSO N. 5969/2013)

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Detalhe da perfuratriz hidráulica fazendo a escavação das estacas de 30cm de diâmetro



Enchimento das estacas escavadas com concreto de fck 25 MPa dosado em central

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Detalhe ao fundo do operário realizando a escavação manual das valas dos blocos de fundação



Detalhe da cabeça da estaca regularizada já com seu respectivo arranque

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Detalhe do lastro de brita no fundo da área escavada e, sobre a brita, a armadura metálica do bloco de fundação p/ duas estacas. Nota-se o vergalhão galvanizado do sistema SPDA ancorado numa das estaca



Detalhe da forma para bloco de fundação de duas estacas

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Concreto (fck 30 Mpa) para enchimento da forma do bloco de fundação




Bloco de fundação concretado

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Armação das vigas baldrame

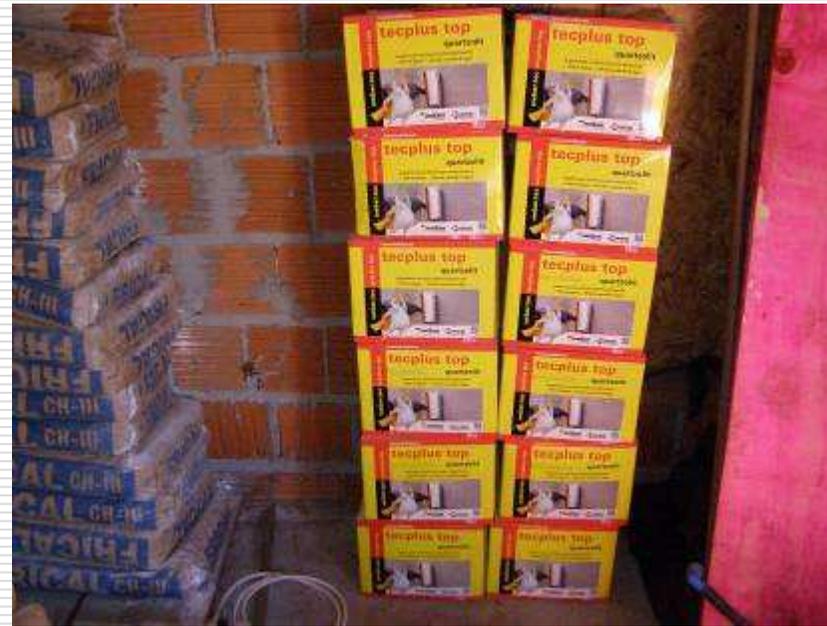

Impermeabilizante semi-flexível Sika Top para passar nas vigas baldrame.

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Detalhe das vigas baldrame concretadas e impermeabilizadas contra percolação de umidade do solo. Nota-se, também, o embasamento com tijolos cerâmicos maciços das paredes de alvenaria que irão ser levantadas

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Detalhe da armação dos pilares e do início do levantamento da alvenaria de vedação externa

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Detalhe do assentamento dos tijolos cerâmicos furados da alvenaria de vedação externa

2ª MEDIÇÃO: 24/04/2014 a 23/05/2014



Detalhe dos muros de fechamento lateral
