## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

# REFORMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24º REGIÃO

2ª medição 07 de dezembro de 2023

#### **DADOS DA OBRA:**

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: GOMES & AZEVEDO LTDA EPP
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: EDILENE AFONSO DE AZEVEDO
- REGISTRO CAU/BR: 00A2277158 Visto RRT N

  o

  13539966
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.683.237,34
- CONTRATO N° 26/2023
- CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
- PROAD 19603/2023
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 03/10/2023
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 1.212.432,25 (25,89%)
- SENDO R\$ 28.096,18 DE MÃO DE OBRA E R\$ 1.184.336,07 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 1.284.667,69 (27,43%)

#### LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS





Locação de andaime

#### LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Extensão do andaime não previsto



#### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI




Colocação de tela em andaime



#### **SERVIÇOS TÉCNICOS**



Engenheira de Segurança do Trabalho

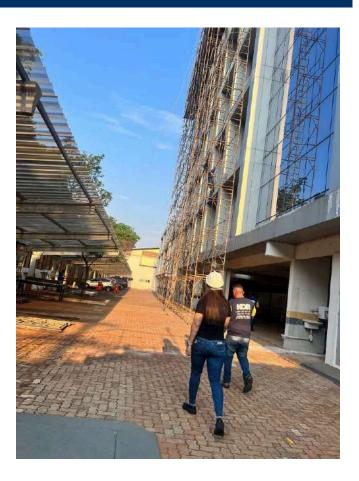

#### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI





EPI – cinturão de segurança trava-quedas



Substituição e instalação do ACM prumadas 2 e 3





Substituição e instalação do ACM - prumada 4





Usinagem ACM





ACM já usinado pronto para instalar





Içando o ACM





Substituição da estrutura metálica para o suporte do ACM



#### **VEDAÇÃO - ESQUADRIAS**



Retirada da borracha existente dos caixilhos




#### **VEDAÇÃO - ESQUADRIAS**






Instalação da nova borracha dos caixilhos


#### SUBSTITUIÇÃO - RUFOS

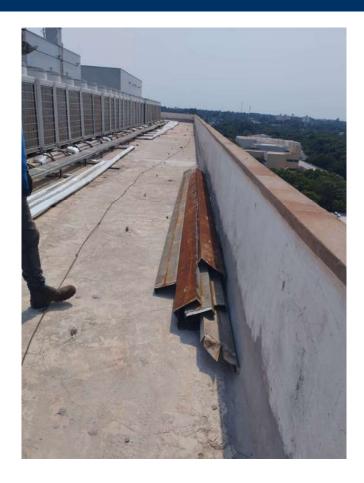

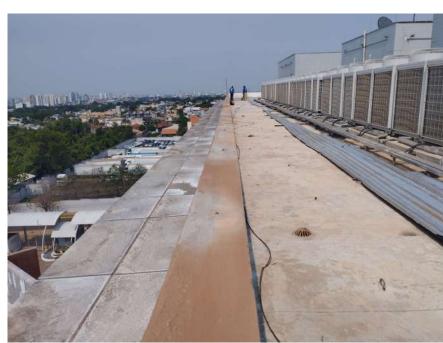

Retirada dos rufos

#### **READEQUAÇÃO - SPDA**

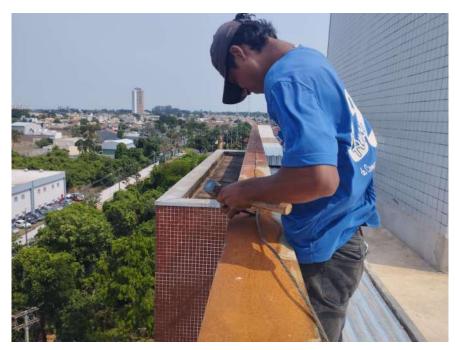



Retirada do cabo de cobre de para-raios
