

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO


4ª medição

05 de março de 2024

DADOS DA OBRA

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: GOMES & AZEVEDO LTDA EPP
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: FELIPE AFONSO DE AZEVEDO / EDILENE AFONSO DE AZEVEDO
- CREA/MS: 64878 CAU/MS: 00A2277158
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.683.237,34
- CONTRATO N° 26/2023
- CONCORRÊNCIA N° 01/2023
- PROAD 19603/2023
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03.10.2023
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 743.062,69
- SENDO R\$ 34.416,98 DE MÃO DE OBRA E R\$ 708.645,71 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 3.290.249,74 (70,26%)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

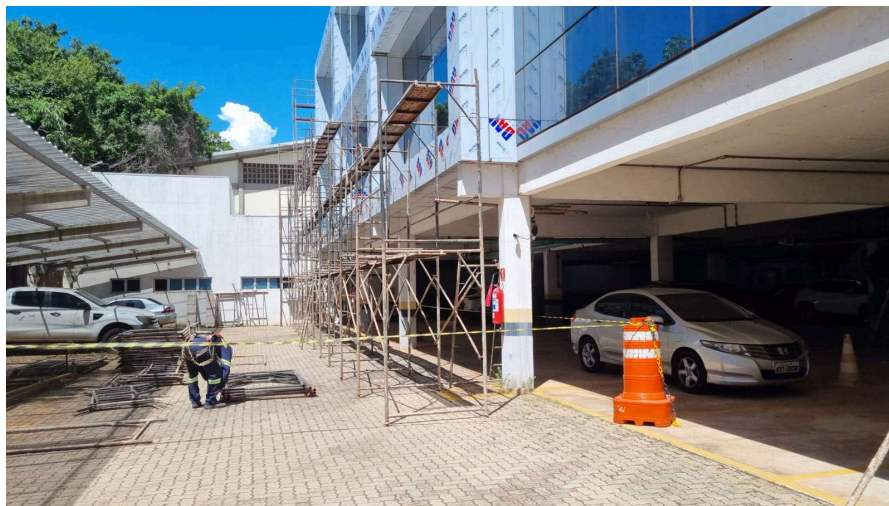

Locação de andaime



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL – EPC/EPI



Tela em andaime fachadeiro



SERVIÇOS TÉCNICOS



Técnica de Segurança do Trabalho

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



Substituição e instalação do ACM na fachada

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



Usinagem do ACM





Detalhe do perfil do ACM

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



VEDAÇÃO - ESQUADRIAS

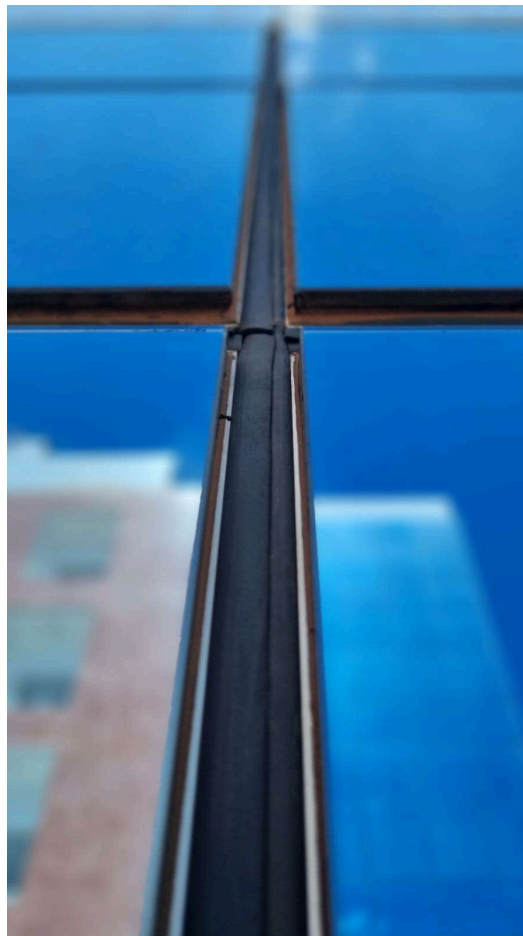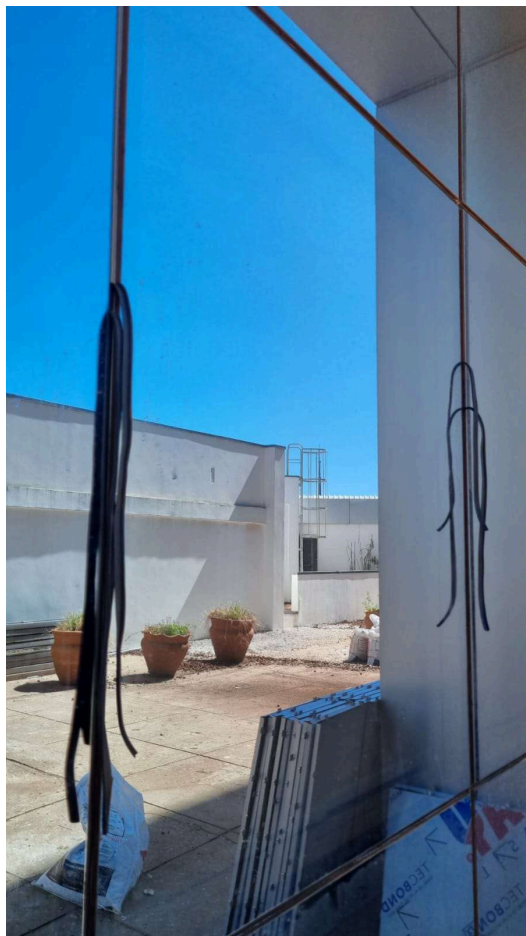

Instalação de novas borrachas nos caixilhos
