

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Jardim-MS

6ª medição (7ª etapa)
15 de agosto de 2018

DADOS DA OBRA: 6ª medição (7ª etapa)

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: TREVO ENGENHARIA
- ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA: NILTON BOSSAY DA COSTA
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.216.938,89
- ÁREA CONSTRUÍDA: 627,00m²
- CONTRATO Nº 07/2018
- PROCESSO ADM. 2017-5733
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES
- FISCAL: ENG. MARCELO NAKAO
- AUTOR DO PROJETO: ENG. MARCELO NAKAO
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$185.750,51

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA



Encarregado Nelson conferindo e redefinindo as distâncias entre terças

REVESTIMENTO DE PAREDE





Detalhe da estrutura em metalon para o revestimento em alumínio composto



Detalhe do porcelanato 90x90cm aplicado na fachada

REVESTIMENTO DE PAREDE

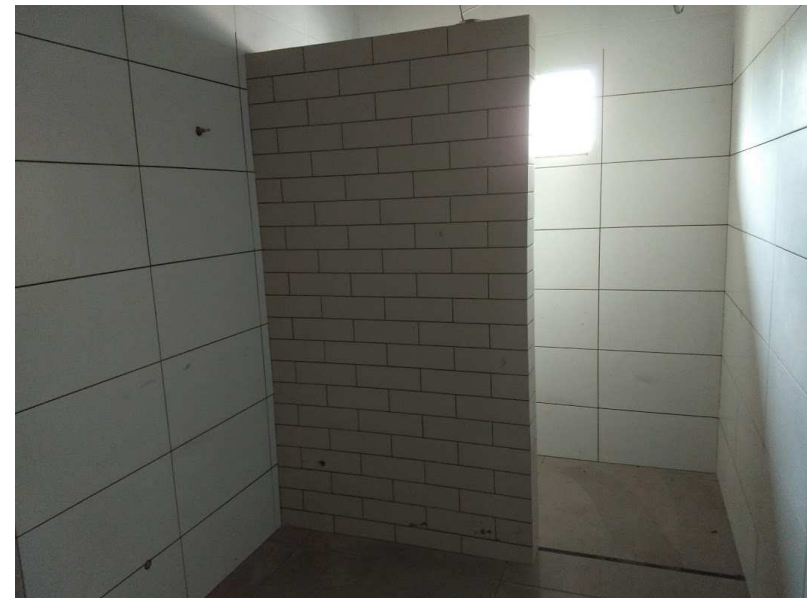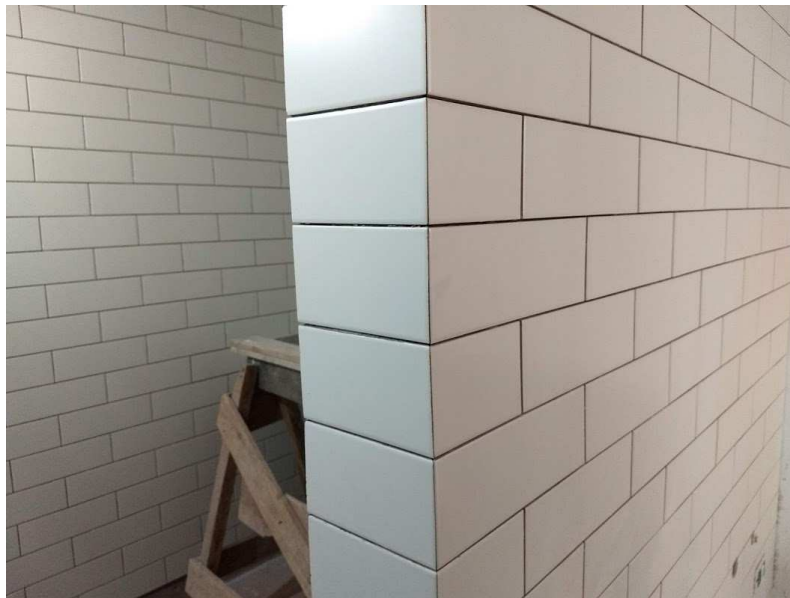

Detalhe dos revestimento aplicados nas paredes dos banheiros

ESQUADRIAS DE MADEIRA



Kit com porta revestida em melamínico, batentes, dobradiças e fechaduras de alto tráfico

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS (aproveitamento de água de chuva)




Caixas de passagens de alvenaria impermeabilizada, grelha e detalhes do filtro e sistema “first flush”

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS




Detalhe da bancada da copa e do balcão da sala multiuso

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

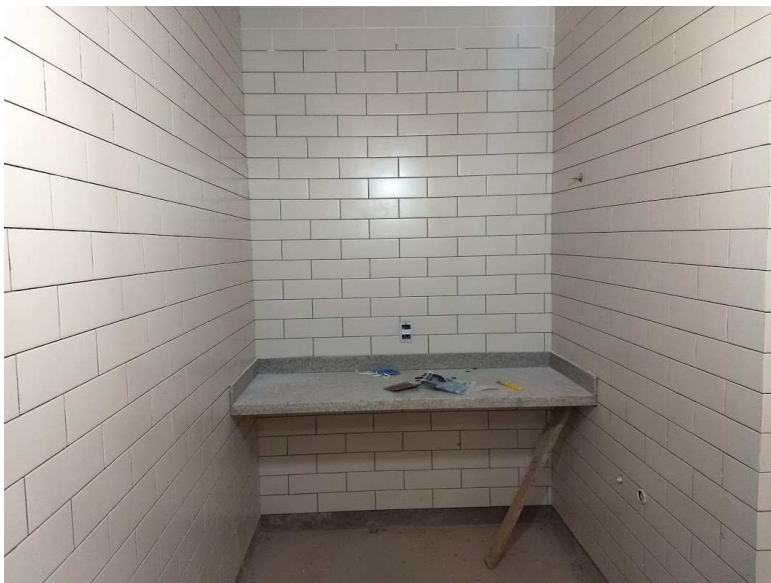


Detalhe do apoio para trocador e da bancada dos banheiros em granito com porta bolsa

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

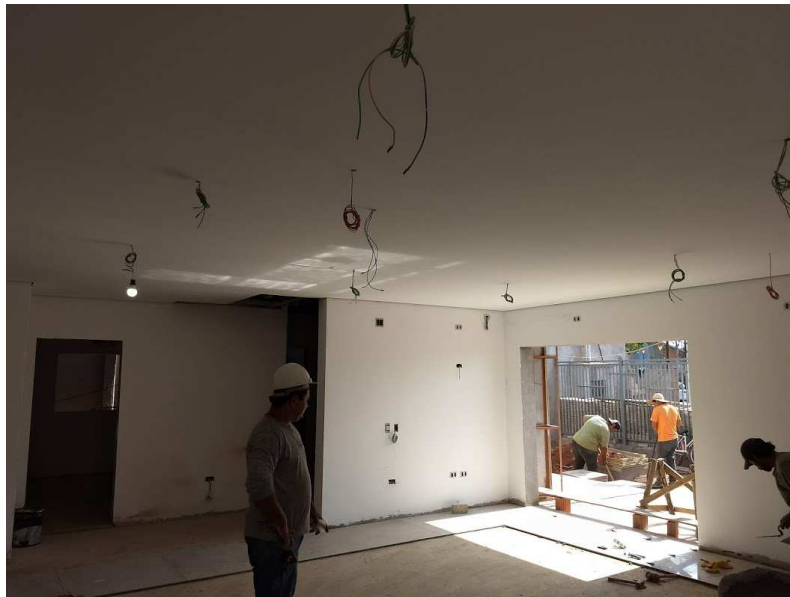

Detalhe da fiação da iluminação da secretaria e da sala de espera

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

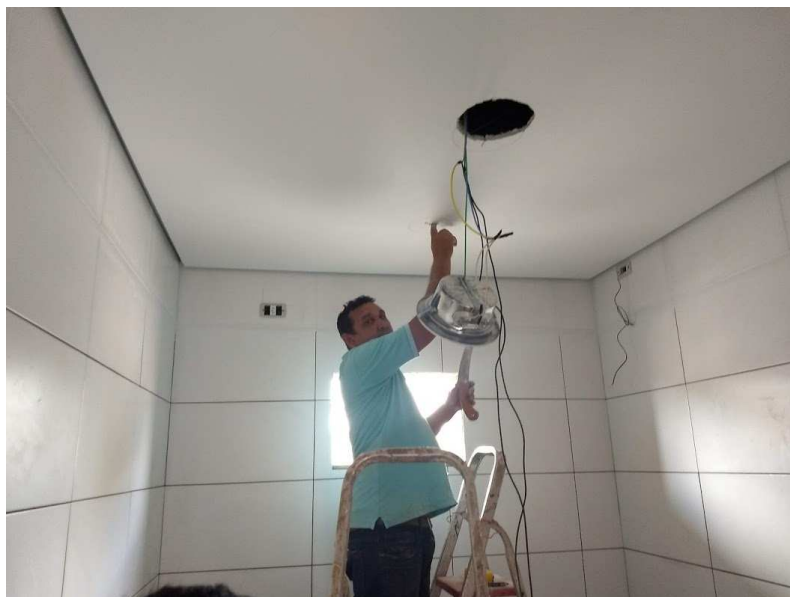

Detalhe da instalação dos ventokits (exaustores)




GESSO ACARTONADO



Estrutura do forro e detalhe do forro de gesso acartonado no corredor

CABEAMENTO ESTRUTURADO

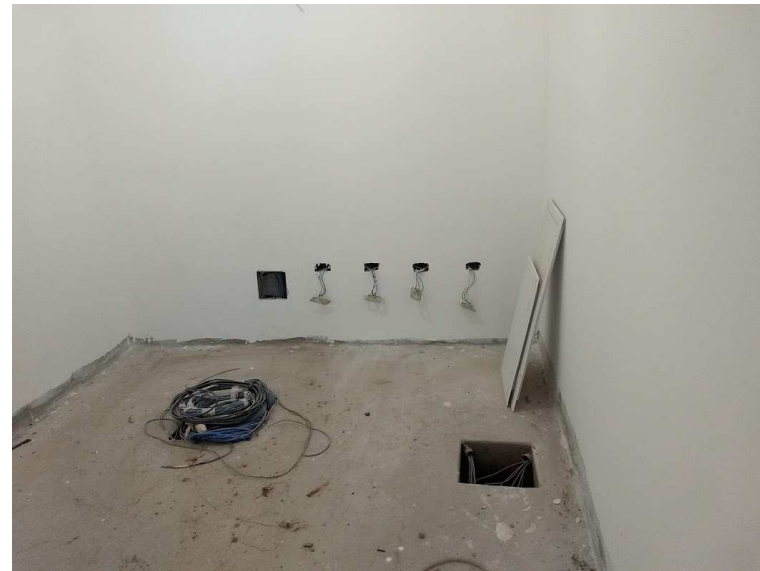

Caixas de passagens sob o piso elevado e detalhe da chegada do cabeamento estruturado na sala técnica

PISOS, PAREDES, RODAPÉS E PEITORIS




Detalhe da aplicação de argamassa industrial no piso e no porcelanato com espátula dentada, em sentido cruzado



Instalação de piso utilizando ventosas

PISOS, PAREDES, RODAPÉS E PEITORIS

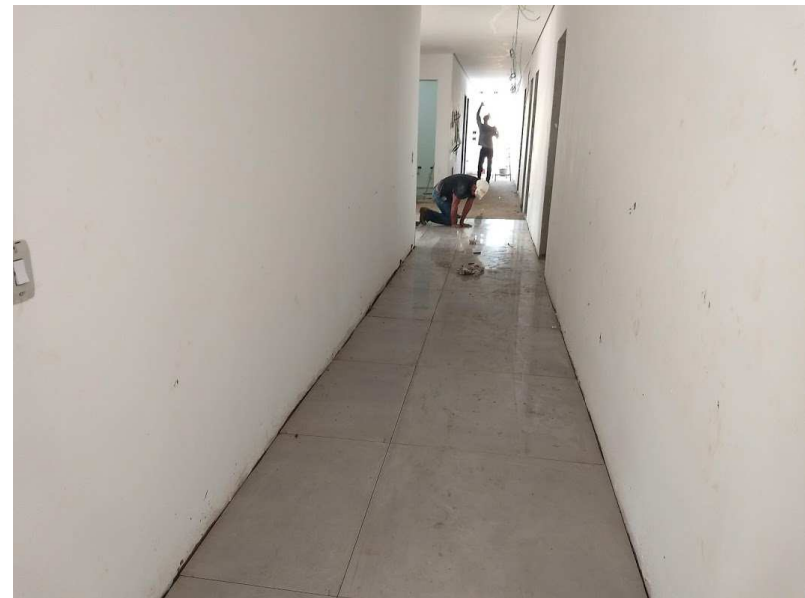


Detalhe do porcelanato aplicado na sala de espera e no corredor

PISOS, PAREDES, RODAPÉS E PEITORIS



Detalhe das soleiras do corredor e da secretaria


PISOS, PAREDES, RODAPÉS E PEITORIS

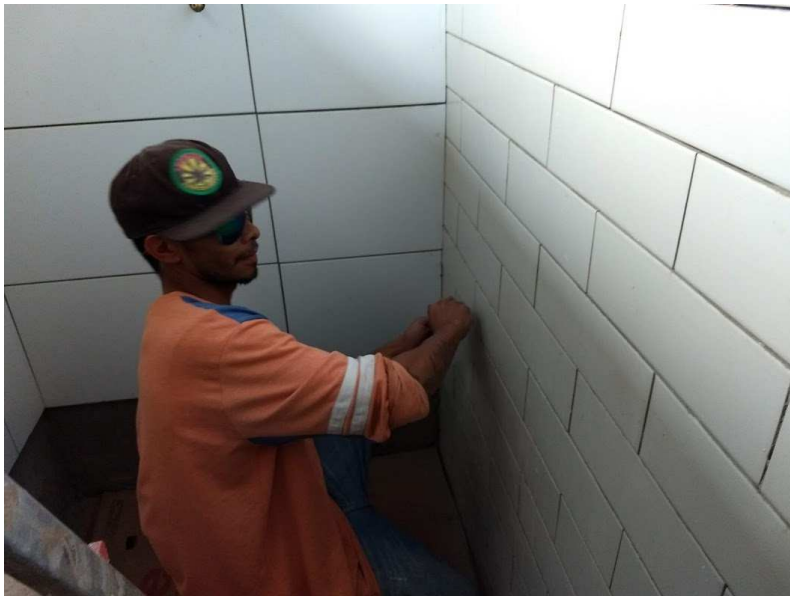

Detalhe da instalação de rodapé e rejuntamento



PISOS, PAREDES, RODAPÉS E PEITORIS

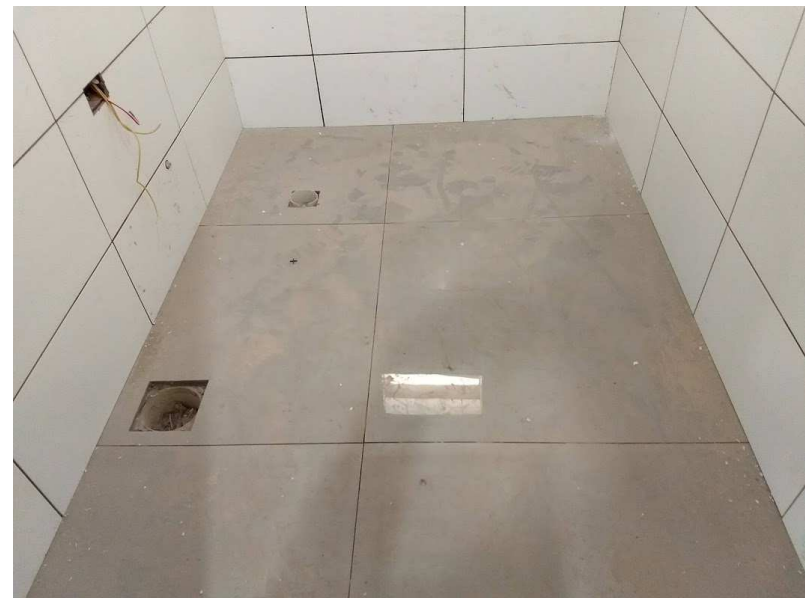

Detalhe do corte do porcelanato e do piso de um banheiro

PINTURA INTERNA E EXTERNA



Aplicação de massa corrida em forro de gesso e em paredes

PINTURA INTERNA E EXTERNA



Lixamento e rolamento de látex em teto




EQUIPAMENTOS METÁLICOS



Detalhe da escada externa e guarda corpo da escada interna

EQUIPAMENTOS METÁLICOS

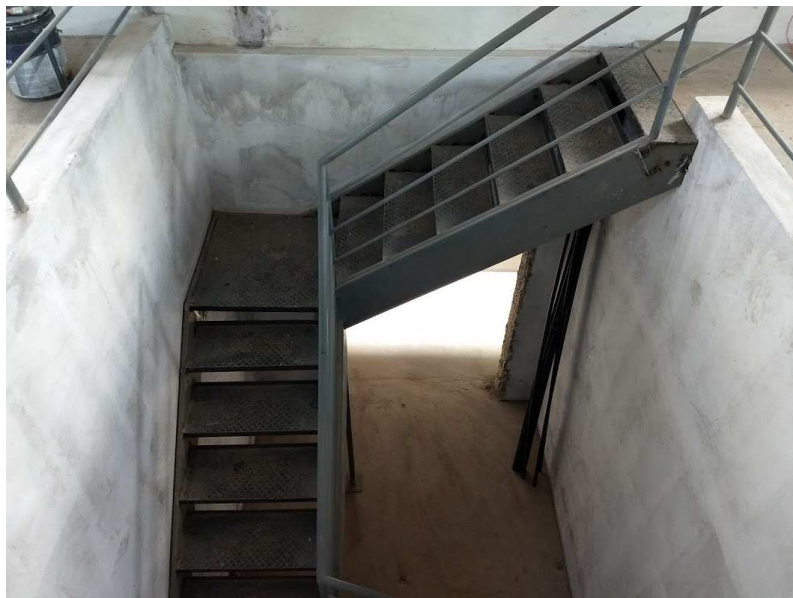

Detalhe da escada interna

