

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

1ª medição

22 de fevereiro de 2023

DADOS DA OBRA

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: GOMES & AZEVEDO LTDA EPP
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: EDILENE AFONSO DE AZEVEDO REGISTRO
- CAU/BR: 00A2277158 Visto RRT Nº 12696375
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.235.065,49
- CONTRATO Nº 01/2023
- TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
- PROAD 23350/2022
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 06/01/2023
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 313.028,13 (25,35%)
- SENDO R\$ 95.406,76 DE MÃO DE OBRA E R\$ 217.621,37 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 313.028,13 (25,35%)

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS



Placa da obra



INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS



Tapume metálico com portão de pedestre

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Guincho elétrico de coluna



Locação de container

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Mobilização do container




Quadro de distribuição de energia

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS




Betoneira

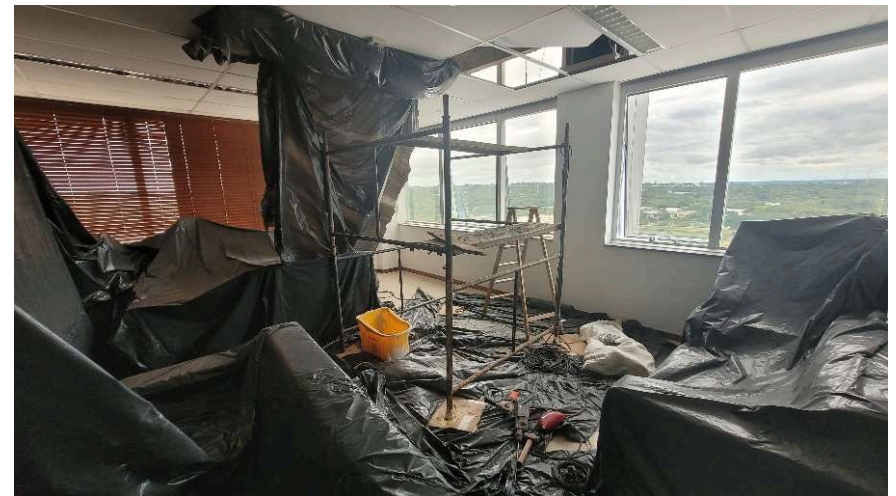

Andaime metálico

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

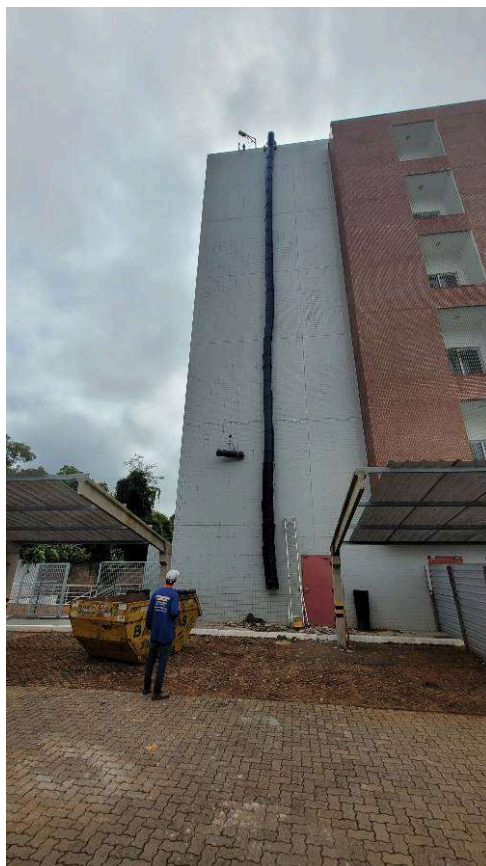

Instalação duto coletor de entulho, por gravidade


SERVIÇOS TÉCNICOS



Foto da engenheira e o técnico do ar-condicionado



REALOCAÇÕES

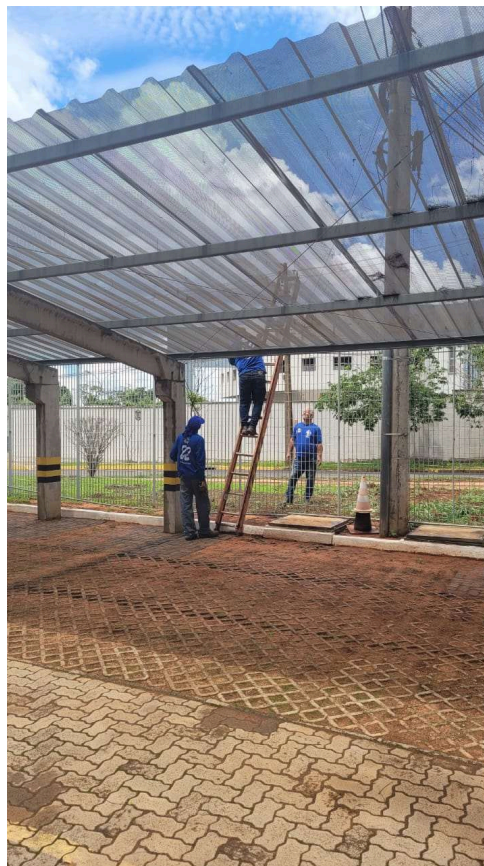

Retirada do gradil

REALOCAÇÕES



Retirada das telhas metálicas




REALOCAÇÕES



Desmontagem, transporte no mesmo pavimento e remontagem de 34 condensadoras do sistema VRF

REALOCAÇÕES

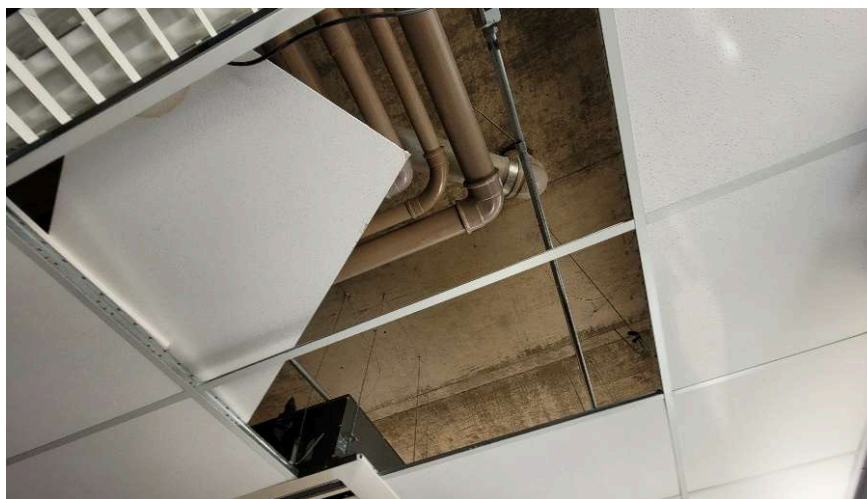

Retirada de forros

DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE



Demolição da regularização (mecanizada com martelete pneumático)

DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE



Retirada de impermeabilização flexível



RETIRADA DE ENTULHOS



Equipe de obra para retirada e transporte vertical de entulho

RETIRADA DE ENTULHOS



Caçamba de entulho



Transporte horizontal com carrinho de mão

READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA



Contra piso do berço (sóculo) do ar condicionado em argamassa



READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA



Aplicação de primer no sóculo



Impermeabilização de superfície com manta asfáltica

READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO E COBERTURA



Ampliação do sistema de drenagem através da instalação dos novos ralos
